

# Fondazione E.N.P.A.M.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri  
via Torino, 38 - 00184 Roma

COMPLESSO IMMOBILIARE IN ROMA VIA LIBERO LEONARDI N.120


LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA


- Rifacimento viabilità interna
- Tinteggiatura scala/autorimessa
- Illuminazione area parcheggio

## CRONOPROGRAMMA

GESTORE: INDIRIZZO SEDE / UFFICIO		ALLEG.		A. 7	
PROGETTISTA: DOTT. ING. CESIDIO SERAFINI VIA G. CALDERINI, 68 00196 ROMA		nome file:			
			DATA	DIS.	VISTO
		REDAZ.	22/05/2007		
		1 AGG.	28/10/2008		
		2 AGG.	30/03/2010		
		3 AGG.			
		4 AGG.			
		5 AGG.			
		6 AGG.			
		7 AGG.			
COMPLESSO:		SOSTITUISCE IL N.		DEL	
FABBRICATO:		SOSTITUITO DAL N.		DEL	
PIANO:					

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1				Mese
				s1	s2	s3	s4	s5
1	Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti	20 g	42'023,58					
2	Risanamenti ed intonaci	21 g	38'201,47					
3	Tinteggiature, verniciature e rivestimenti	39 g	121'026,24					
4	Impermeabilizzazioni, controsoffitti e coibentazioni	71 g	181'379,40					
5	Massetti e pavimenti	23 g	68'433,78					
6	Segnaletica, opere accessorie	14 g	9'462,64					
7	Opere in ferro, metallo e vetro	10 g	39'823,77					
8	Impianti elett./illum./antincendio	11 g	63'878,06					
9	Allestimento impianto di cantiere, opere di sicurezza e smobilizzo impianto	4 g	15'495,48					

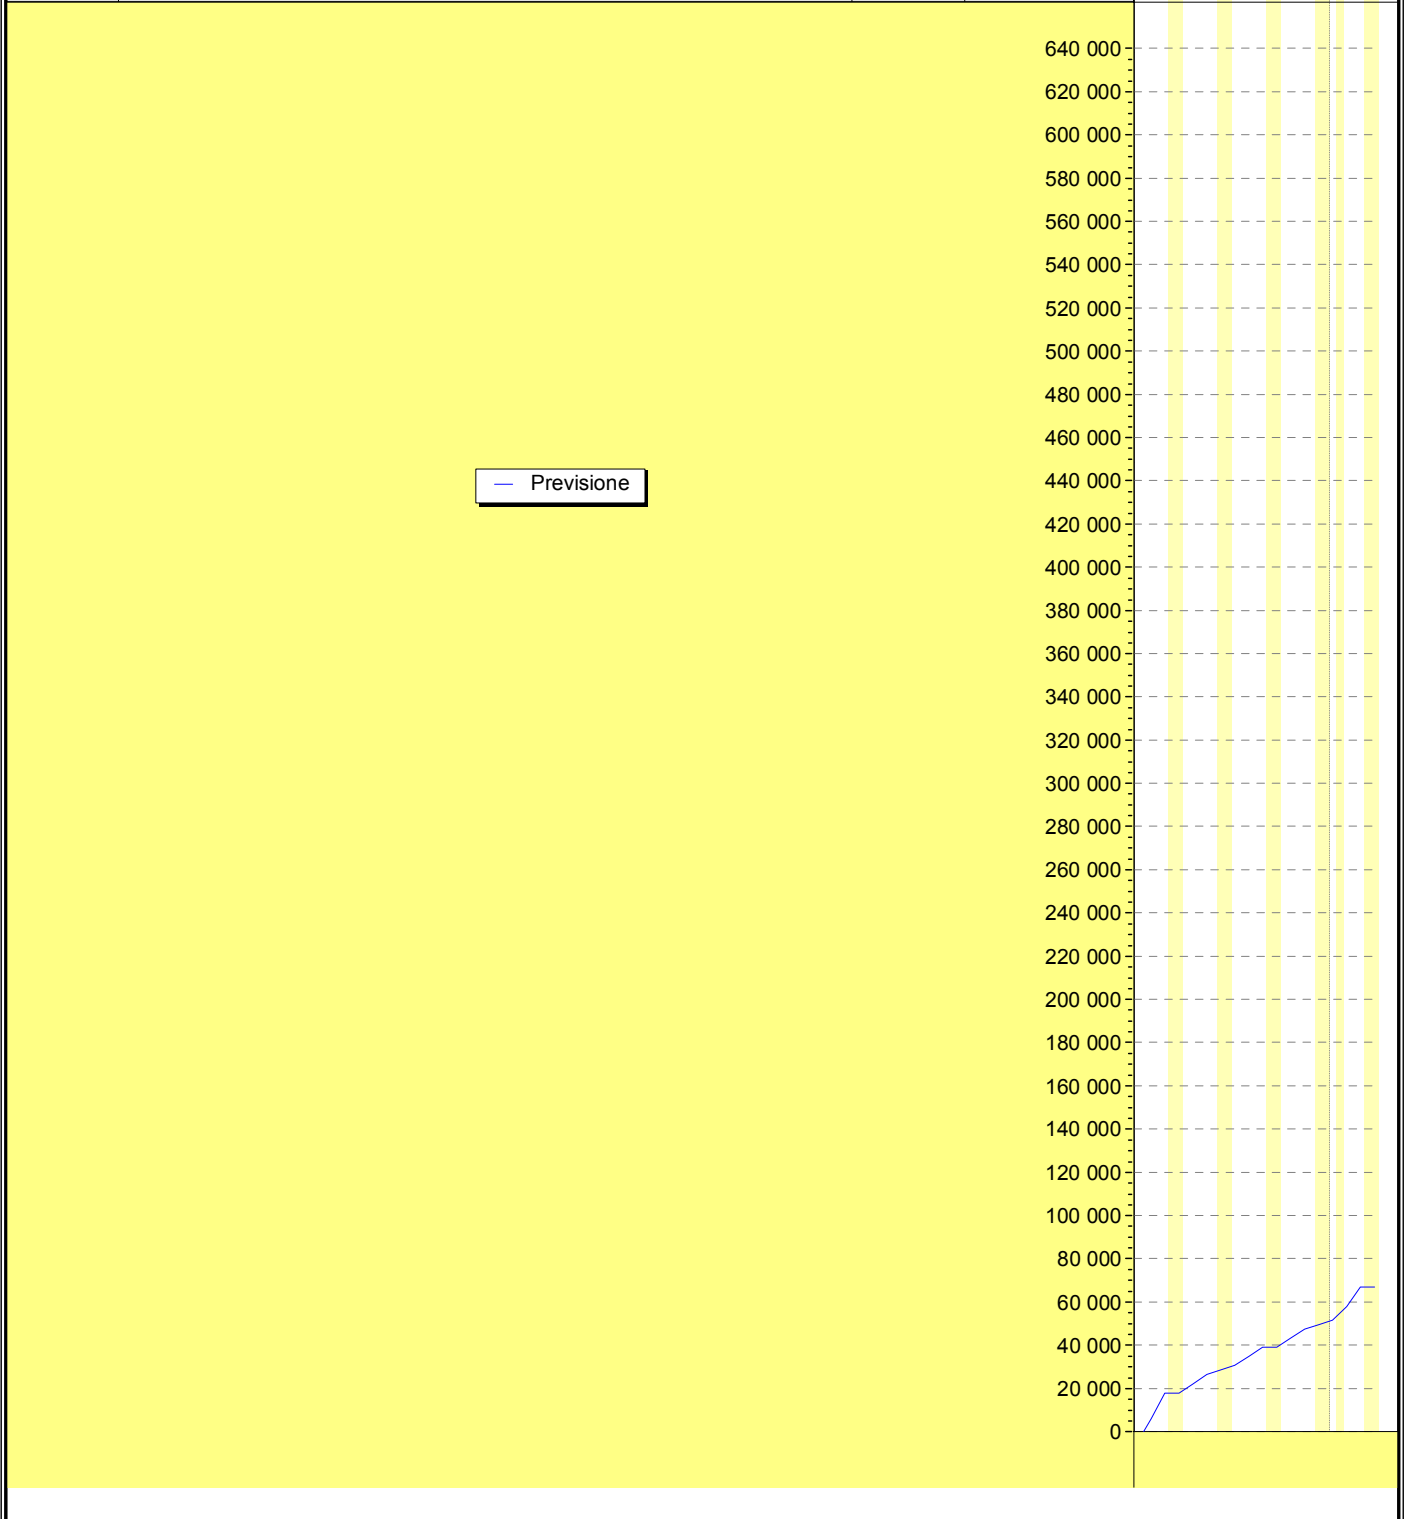

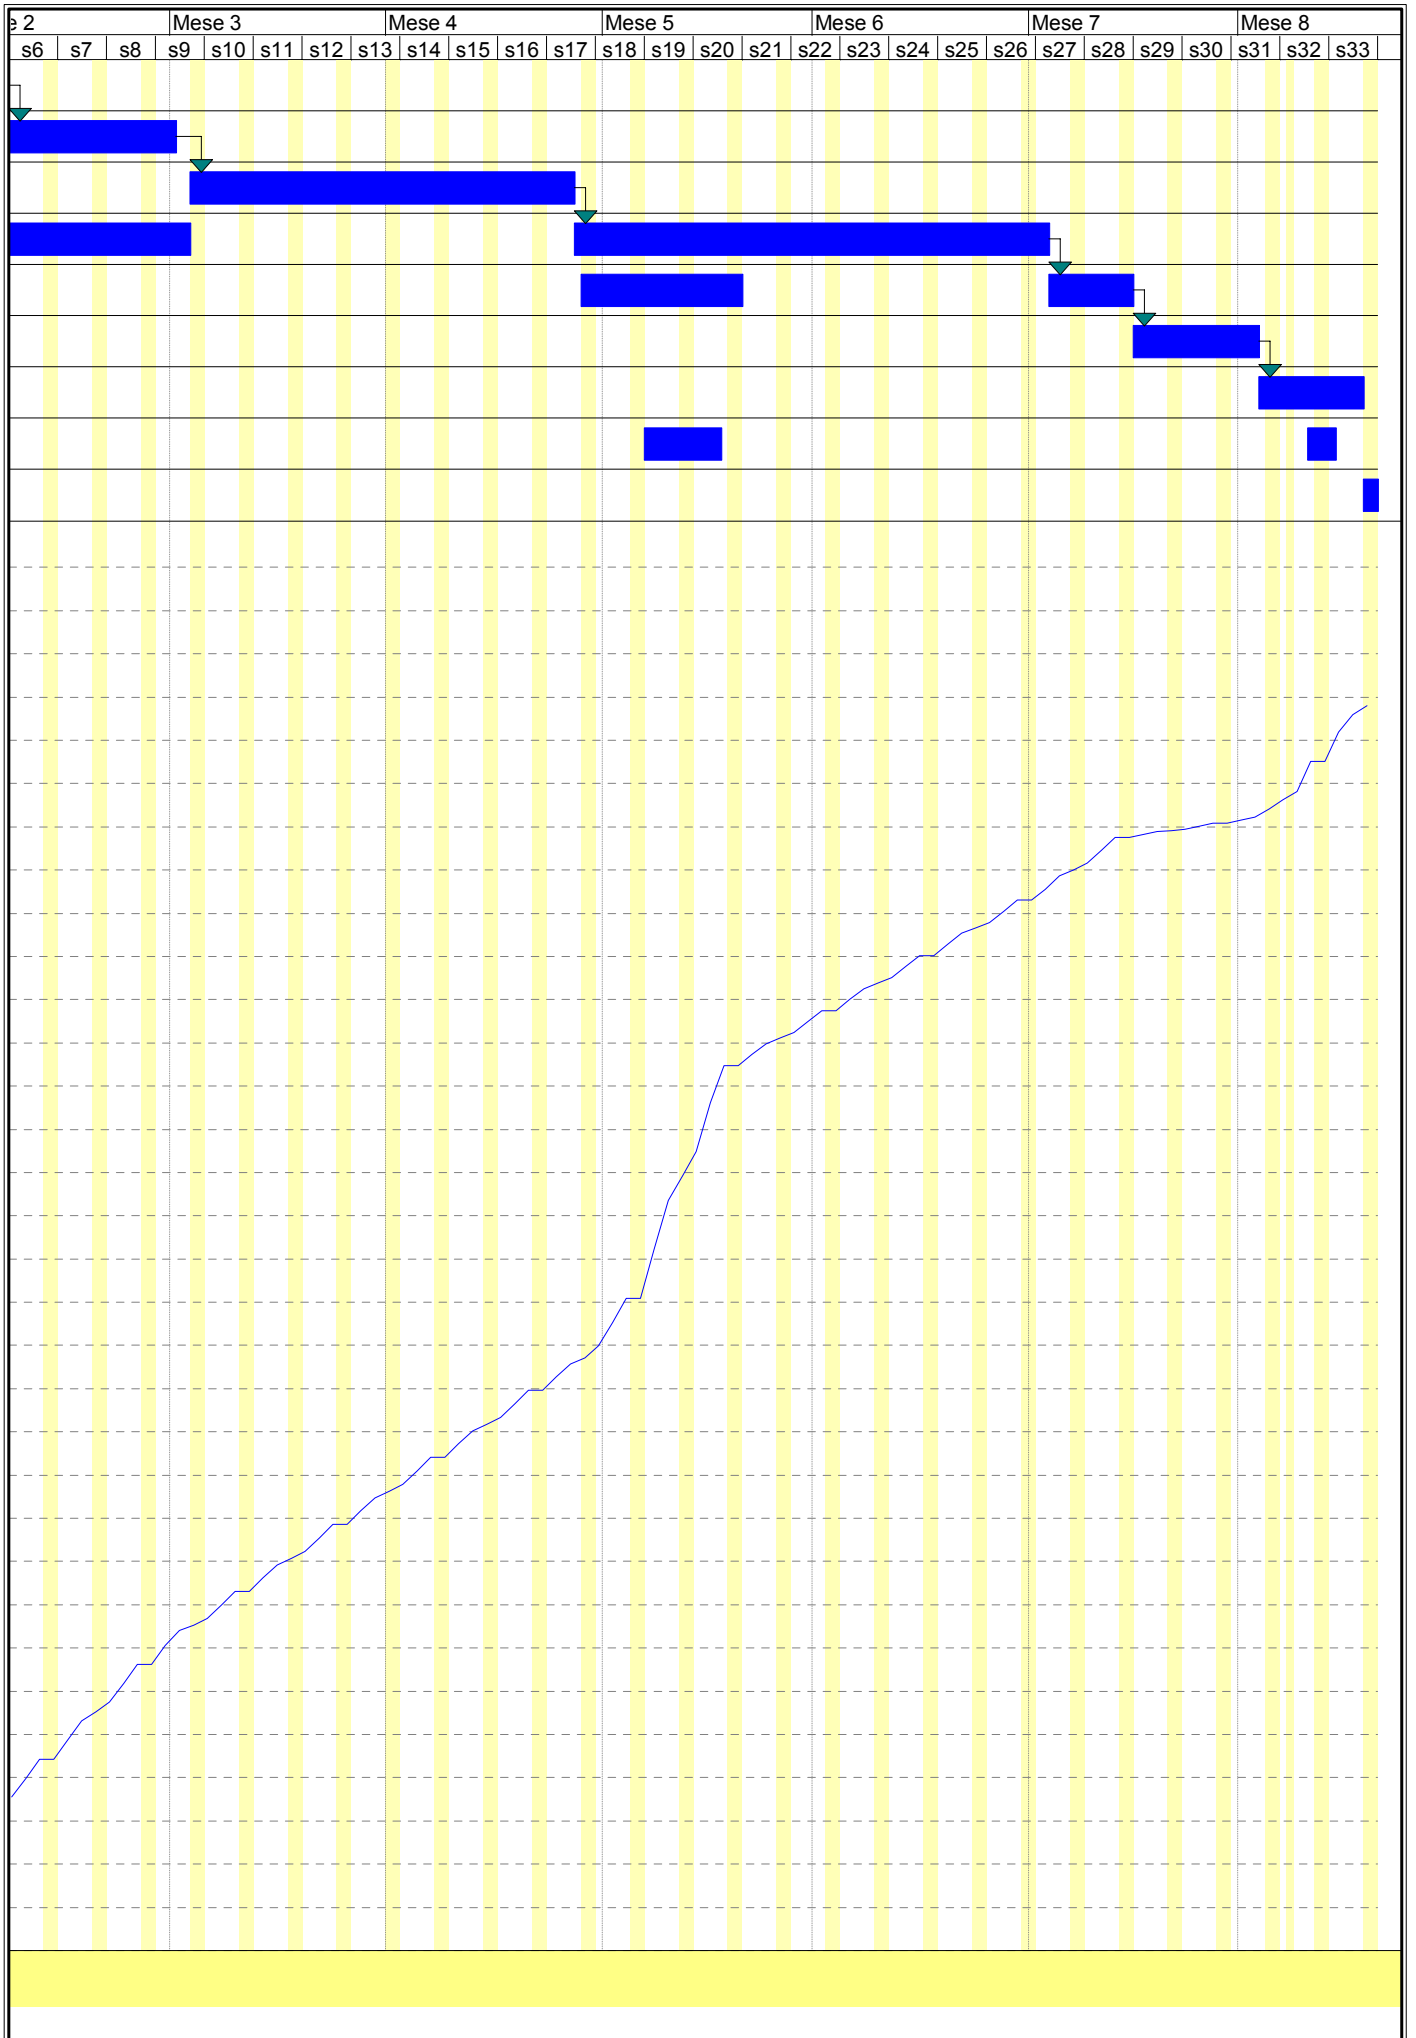

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI		
	euro	(% )			Lav.	Tot.	
Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti	42'023,58	7,25	1 gg	29 gg	20	29	
Risanamenti ed intonaci	38'201,47	6,59	29 gg	57 gg	21	29	
Tinteggiature, verniciature e rivestimenti	121'026,24	20,88	60 gg	114 gg	39	55	
Impermeabilizzazioni, controsoffitti e coibentazioni	181'379,40	31,29	29 gg	182 gg	71	99	
	<i>periodo 01</i>	<i>58'756,71</i>	<i>10,14</i>	<i>29 gg</i>	<i>59 gg</i>	<i>23</i>	<i>31</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>122'622,69</i>	<i>21,15</i>	<i>115 gg</i>	<i>182 gg</i>	<i>48</i>	<i>68</i>
Massetti e pavimenti	68'433,78	11,80	116 gg	194 gg	23	35	
	<i>periodo 01</i>	<i>44'630,73</i>	<i>7,70</i>	<i>116 gg</i>	<i>138 gg</i>	<i>15</i>	<i>23</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>23'803,05</i>	<i>4,11</i>	<i>183 gg</i>	<i>194 gg</i>	<i>8</i>	<i>12</i>
Segnaletica, opere accessorie	9'462,64	1,63	195 gg	212 gg	14	18	
Opere in ferro, metallo e vetro	39'823,77	6,87	213 gg	227 gg	10	15	
Impianti elett./illum./antincendio	63'878,06	11,02	125 gg	223 gg	11	15	
	<i>periodo 01</i>	<i>52'263,87</i>	<i>9,02</i>	<i>125 gg</i>	<i>135 gg</i>	<i>9</i>	<i>11</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>11'614,19</i>	<i>2,00</i>	<i>220 gg</i>	<i>223 gg</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Allestimento impianto di cantiere, opere di sicurezza e smobilizzo impianto di cantiere	15'495,48	2,67	1 gg	230 gg	4	8	
	<i>periodo 01</i>	<i>11'621,61</i>	<i>2,00</i>	<i>1 gg</i>	<i>5 gg</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>3'873,87</i>	<i>0,67</i>	<i>228 gg</i>	<i>230 gg</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
Roma, 02/03/2009							
<b>Il Tecnico</b> Dott. Ing. Cesidio Serafini							

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	5'975,05	5'975,05	1,03
2 gg	5'975,05	11'950,10	2,06
3 gg	5'975,05	17'925,15	3,09
6 gg	2'101,18	20'026,33	3,45
7 gg	2'101,18	22'127,50	3,82
8 gg	2'101,18	24'228,68	4,18
9 gg	2'101,18	26'329,86	4,54
10 gg	2'101,18	28'431,04	4,90
13 gg	2'101,18	30'532,22	5,27
14 gg	2'101,18	32'633,40	5,63
15 gg	2'101,18	34'734,58	5,99
16 gg	2'101,18	36'835,76	6,35
17 gg	2'101,18	38'936,94	6,72
20 gg	2'101,18	41'038,12	7,08
21 gg	2'101,18	43'139,30	7,44
22 gg	2'101,18	45'240,47	7,80
23 gg	2'101,18	47'341,65	8,17
24 gg	2'101,18	49'442,83	8,53
27 gg	2'101,18	51'544,01	8,89
29 gg	6'474,94	58'018,95	10,01
30 gg	4'373,76	62'392,70	10,76
31 gg	4'373,76	66'766,46	11,52
34 gg	4'373,76	71'140,22	12,27
35 gg	4'373,76	75'513,98	13,03
36 gg	4'373,76	79'887,73	13,78
37 gg	4'373,76	84'261,49	14,53
38 gg	4'373,76	88'635,25	15,29
41 gg	4'373,76	93'009,00	16,04
42 gg	4'373,76	97'382,76	16,80
43 gg	4'373,76	101'756,52	17,55
44 gg	4'373,76	106'130,27	18,31
45 gg	4'373,76	110'504,03	19,06
48 gg	4'373,76	114'877,79	19,82
49 gg	4'373,76	119'251,55	20,57
50 gg	4'373,76	123'625,30	21,32
51 gg	4'373,76	127'999,06	22,08
52 gg	4'373,76	132'372,82	22,83
55 gg	4'373,76	136'746,57	23,59
56 gg	4'373,76	141'120,33	24,34
57 gg	4'373,76	145'494,09	25,10
58 gg	2'554,64	148'048,73	25,54
59 gg	2'554,64	150'603,37	25,98
62 gg	3'103,24	153'706,60	26,51
63 gg	3'103,24	156'809,84	27,05
64 gg	3'103,24	159'913,08	27,58
65 gg	3'103,24	163'016,31	28,12
66 gg	3'103,24	166'119,55	28,65
69 gg	3'103,24	169'222,79	29,19
70 gg	3'103,24	172'326,03	29,73
71 gg	3'103,24	175'429,26	30,26
72 gg	3'103,24	178'532,50	30,80
73 gg	3'103,24	181'635,74	31,33
76 gg	3'103,24	184'738,97	31,87
77 gg	3'103,24	187'842,21	32,40
78 gg	3'103,24	190'945,45	32,94
79 gg	3'103,24	194'048,68	33,47
80 gg	3'103,24	197'151,92	34,01
83 gg	3'103,24	200'255,16	34,54
84 gg	3'103,24	203'358,39	35,08
85 gg	3'103,24	206'461,63	35,61
86 gg	3'103,24	209'564,87	36,15
87 gg	3'103,24	212'668,11	36,68
90 gg	3'103,24	215'771,34	37,22
91 gg	3'103,24	218'874,58	37,75
92 gg	3'103,24	221'977,82	38,29
93 gg	3'103,24	225'081,05	38,83
94 gg	3'103,24	228'184,29	39,36
97 gg	3'103,24	231'287,53	39,90
98 gg	3'103,24	234'390,76	40,43
99 gg	3'103,24	237'494,00	40,97
100 gg	3'103,24	240'597,24	41,50
101 gg	3'103,24	243'700,47	42,04
104 gg	3'103,24	246'803,71	42,57
105 gg	3'103,24	249'906,95	43,11
106 gg	3'103,24	253'010,19	43,64

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
107 gg	3'103,24	256'113,42	44,18
108 gg	3'103,24	259'216,66	44,71
111 gg	3'103,24	262'319,90	45,25
112 gg	3'103,24	265'423,13	45,78
113 gg	3'103,24	268'526,37	46,32
114 gg	3'103,24	271'629,61	46,85
115 gg	2'554,64	274'184,25	47,30
118 gg	5'530,02	279'714,27	48,25
119 gg	5'530,02	285'244,29	49,20
120 gg	5'530,02	290'774,31	50,16
121 gg	5'530,02	296'304,33	51,11
122 gg	5'530,02	301'834,35	52,07
125 gg	11'337,12	313'171,47	54,02
126 gg	11'337,12	324'508,59	55,98
127 gg	11'337,12	335'845,70	57,93
128 gg	11'337,12	347'182,82	59,89
129 gg	11'337,12	358'519,94	61,84
132 gg	11'337,12	369'857,06	63,80
133 gg	11'337,12	381'194,18	65,75
134 gg	11'337,12	392'531,29	67,71
135 gg	11'337,12	403'868,41	69,67
136 gg	5'530,02	409'398,43	70,62
139 gg	2'554,64	411'953,07	71,06
140 gg	2'554,64	414'507,71	71,50
141 gg	2'554,64	417'062,35	71,94
142 gg	2'554,64	419'616,99	72,38
143 gg	2'554,64	422'171,63	72,82
146 gg	2'554,64	424'726,27	73,26
147 gg	2'554,64	427'280,91	73,70
148 gg	2'554,64	429'835,55	74,14
149 gg	2'554,64	432'390,19	74,59
150 gg	2'554,64	434'944,83	75,03
153 gg	2'554,64	437'499,47	75,47
154 gg	2'554,64	440'054,10	75,91
155 gg	2'554,64	442'608,74	76,35
156 gg	2'554,64	445'163,38	76,79
157 gg	2'554,64	447'718,02	77,23
160 gg	2'554,64	450'272,66	77,67
161 gg	2'554,64	452'827,30	78,11
162 gg	2'554,64	455'381,94	78,55
163 gg	2'554,64	457'936,58	78,99
164 gg	2'554,64	460'491,22	79,43
167 gg	2'554,64	463'045,86	79,87
168 gg	2'554,64	465'600,50	80,31
169 gg	2'554,64	468'155,14	80,75
170 gg	2'554,64	470'709,78	81,20
171 gg	2'554,64	473'264,42	81,64
174 gg	2'554,64	475'819,06	82,08
175 gg	2'554,64	478'373,70	82,52
176 gg	2'554,64	480'928,34	82,96
177 gg	2'554,64	483'482,98	83,40
178 gg	2'554,64	486'037,61	83,84
181 gg	2'554,64	488'592,25	84,28
182 gg	2'554,64	491'146,89	84,72
183 gg	2'975,38	494'122,28	85,23
184 gg	2'975,38	497'097,66	85,75
185 gg	2'975,38	500'073,04	86,26
188 gg	2'975,38	503'048,42	86,77
189 gg	2'975,38	506'023,80	87,29
190 gg	2'975,38	508'999,18	87,80
191 gg	2'975,38	511'974,57	88,31
192 gg	2'975,38	514'949,95	88,83
195 gg	675,90	515'625,85	88,94
196 gg	675,90	516'301,75	89,06
197 gg	675,90	516'977,66	89,18
198 gg	675,90	517'653,56	89,29
199 gg	675,90	518'329,46	89,41
202 gg	675,90	519'005,36	89,53
203 gg	675,90	519'681,27	89,64
204 gg	675,90	520'357,17	89,76
205 gg	675,90	521'033,07	89,88
206 gg	675,90	521'708,98	89,99
209 gg	675,90	522'384,88	90,11
210 gg	675,90	523'060,78	90,23
211 gg	675,90	523'736,68	90,34

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
212 gg	675,90	524'412,59	90,46
213 gg	3'982,38	528'394,96	91,15
216 gg	3'982,38	532'377,34	91,83
218 gg	3'982,38	536'359,72	92,52
219 gg	3'982,38	540'342,10	93,21
220 gg	9'789,47	550'131,57	94,90
223 gg	9'789,47	559'921,04	96,58
224 gg	3'982,38	563'903,42	97,27
225 gg	3'982,38	567'885,80	97,96
226 gg	3'982,38	571'868,17	98,64
227 gg	3'982,38	575'850,55	99,33
230 gg	3'873,87	579'724,42	100,00
Roma, 02/03/2009			
<b>il Tecnico</b> Dott. Ing. Cesidio Serafini			
